

■ Régions • Auvergne •  
Bourgogne • Centre •  
Languedoc-Roussillon  
• Limousin • Pays de la  
Loire • Rhône-Alpes ■  
Départements • Allier •  
Ardèche • Cher • Creuse •  
Indre-et-Loire • Loir-et-Cher  
• Loire • Haute-Loire • Loire-  
Atlantique • Loiret • Lozère  
• Maine-et-Loire • Nièvre  
• Puy-de-Dôme • Saône-  
et-Loire • Haute-Vienne ■  
Villes et Agglos • Angers  
Loire Métropole • Blois •  
Bourges • Châteauroux  
• Clermont Communauté •  
Joué-Lès-Tours • Limoges  
• Montluçon • Nantes  
Métropole • Nevers •  
Orléans • Saint-Etienne-  
Métropole • Saint-Nazaire •  
Le Grand Roanne • Saumur  
Loire Développement •  
Tours • Vichy • Vierzon ■  
SICALA • Allier • Cher •  
Indre-et-Loire • Loir-et-  
Cher • Haute-Loire • Loiret  
• Maine-et-Loire • Nièvre •  
Saône-et-Loire

## Exécution de la convention de mandat de la Région Centre à l'Établissement public Loire dans le cadre du plan Loire 2007-2013

Gestion et suivi du programme lit et levées  
de la Loire  
Rapport août 2012



Exécution de la convention de mandat  
de la Région Centre à l'Établissement public Loire  
dans le cadre du plan Loire 2007-2013

---

Gestion et suivi du programme lit et levées de la Loire  
Rapport août 2012

## SOMMAIRE

I	Rappel du contexte .....	2
II	Programmations en cours .....	3
III	Nouvelle programmation et prévisions .....	5
IV	Synthèse et conclusions .....	7
V	Annexes .....	10

# I Rappel du contexte

## I.1 Cadre et financement de la mission de l'EP Loire

Dans le cadre de deux conventions signées en février 2008, la Région Centre a notamment confié à l'Etablissement public Loire le suivi de la programmation et de l'exécution, au plan administratif, technique et financier, du programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre mis en œuvre par les services de l'Etat dans le cadre du plan Loire 2007-2013.

Jusqu'au 31 décembre 2011, ce travail a été assuré dans le cadre d'un volet de l'action de coordination technique pour la réduction du risque d'inondation en Loire moyenne, engagée par l'Etablissement depuis mi 2008. Ce volet a été cofinancé par la Région Centre et les Départements d'Indre-et-Loire, du Loiret, du Loir-et-Cher et du Cher, et par l'Etat (jusqu'en 2010 pour ce dernier).

Les services de l'Etat ne souhaitant plus financer ce suivi, cette mission fait l'objet depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012 d'une opération spécifique cofinancée uniquement par les collectivités concernées dans le cadre du plan Loire.

## I.2 Cadre financier du programme lit et levées 2007-2013

En se basant sur le programme prévisionnel initial (programme « ferme ») de 31,7M€ proposé par l'Etat au démarrage de la troisième phase du plan Loire, la Région Centre a prévu une participation à ce programme à hauteur de 11 M€ sur la période correspondante (participation de 33,33% pour les opérations relatives aux levées et de 40% pour les opérations relatives au lit). La part de cofinancement prévue des quatre Départements concernés est de 8,5 M€ (33,33% de participation sur les levées) et celle de l'Etat de 12,2 M€ (33,34% pour les levées et 60% pour le lit).

Au cours des réunions avec les cofinanceurs qui se sont tenues au printemps 2011, les services de l'Etat ont indiqué qu'il pourrait être proposé de labelliser des opérations de renforcement des levées domaniales du plan Loire, encore non démarrées, **au titre du Plan de Submersions Rapides**. Ce plan prévoit notamment une mobilisation du FPRNM (fonds Barnier) à un taux d'intervention de 40%, le FPRNM pouvant alors intervenir en substitution de la participation de l'Etat (au taux actuel de 33%), voire en complément de ces crédits budgétaires, ce qui allègerait plus significativement le taux de participation des collectivités, avec un plan de financement : 40% FPRNM, 20% Etat, 20% Région et 20% Départements.

A ce sujet, on rappellera pour mémoire la délibération n°10-128 du 07 octobre 2010 du Comité Syndical de l'Etablissement public Loire qui attire notamment l'attention « *sur la nécessité, à l'échelle du bassin de la Loire et ses affluents, et pour ce qui concerne plus particulièrement l'Etablissement public Loire, d'envisager la possibilité de mobilisation de la part Etat du financement des travaux de confortement des digues domaniales à hauteur des taux renforcés prévus pour l'intervention du FPRNM (40%).* »

Sans augmentation du montant total de participation des collectivités prévu au CPIER, ceci permettrait à l'Etat de proposer plus d'opérations à réaliser d'ici 2013. Plusieurs opérations de renforcement de levées, en cours ou à programmer au plan Loire pourraient ainsi bénéficier de ce dispositif. Cependant, compte tenu des difficultés potentielles pour l'Etat à mobiliser le FPRNM en tant que maître d'ouvrage, ce type de financement est actuellement testé sur deux opérations labellisées et programmées au Comité de gestion de février 2012 (LEV 45-26 « Melleray » et LEV 37-1 « Renforcement de pied de levée à Amboise »).

## II Programmations en cours

### II.1 Programmation 2007-2008 :

Cette programmation comporte **16 opérations** programmées entre octobre 2007 et juin 2008, pour un **montant total de 8,135M€** très inférieur au montant prévisionnel initial du programme « ferme » estimé à 14,735M€ (le report et l'ajustement de certaines opérations concernant le Cher et l'Indre-et-Loire ont conduit à réviser le montant de cette programmation à la baisse en 2009) :

- 9 opérations concernent des travaux et études sur les levées programmés pour un montant de 6,615M€,
- 7 opérations concernent des travaux et études sur le lit programmés pour un montant de 1,520 M€.

La **participation de la Région Centre** correspondante s'élève à **2,812M€**.

De nouveaux ajustements intervenus au premier semestre 2011 sur deux opérations ont conduit à une nouvelle réduction du montant total de cette programmation à hauteur de **7,615M€** au lieu de 8,135M€ soit une participation de la Région Centre de **2,639M€**

En tenant compte du montant effectif des opérations soldées, le montant de la programmation 2007-2008 s'élève à ce jour à **7,501M€ pour une participation de la Région Centre de 2,6M€**

De 2008 à 2011, un cumul de **2,268M€** de fonds de concours correspondant à la participation de la Région Centre a été versé à l'Etat par l'Etablissement public Loire, soit **87%** du montant conventionné avec l'Etat.

Compte tenu des informations fournies par les services de l'Etat, au 31/12/2011, le montant de réalisation de cette programmation s'élève à **5,462M€** (contre 4,988M€ fin 2010), soit un taux de mandatement de l'Etat de **73%** (contre 66% fin 2010).

Sur les 16 opérations de cette programmation, **7 sont achevées physiquement à ce jour**. Il s'agit de 3 opérations dans le Loiret (LEV 45-2à7, LEV 45-1 et LIT 45-5), de 2 opérations dans le Cher (LIT 18-1 et LIT 18-3), d'une opération en Indre-et-Loire (LIT 37-2) et d'une opération dans le Loir-et-Cher (LEV 41-5).

A l'inverse, **plusieurs opérations sont peu avancées** compte tenu de leur date de programmation. Il s'agit notamment des 6 opérations LEV 18-1, LEV 41-3 et 4, LIT 41-1, LEV 45-20, LIT 45-1 et 3, et LIT 45-4, qui sont toutes des opérations d'études, et dont les taux de mandatement s'échelonnent de 0 à 48%.

Le tableau détaillé de suivi des opérations programmées en 2007-2008 est présenté en annexe 1 de ce rapport.

### II.2 Programmation 2009 :

Cette seconde programmation comprend **9 opérations** programmées entre janvier et octobre 2009, pour un **montant total de 5,8M€** et une **participation de la Région Centre de 1,973M€** :

- 7 opérations concernent des travaux et études sur les levées pour un montant de 5,2M€,
- 2 opérations concernent des travaux et études sur le lit pour un montant de 0,6M€.

Sur les 14 opérations initialement prévues pour cette programmation, 4 ont été reportées et une annulée en octobre 2009.

Un ajustement intervenu au premier semestre 2011 sur une opération a conduit à une réduction du montant total de cette programmation à hauteur de **5,5M€** au lieu de 5,8M€ et une participation de la Région Centre de **1,873M€**

En tenant compte du montant effectif des opérations soldées, le montant de la programmation 2009 s'élève à ce jour à **5,316M€ pour une participation de la Région Centre de 1,811M€**

De 2009 à 2011, un cumul de **1,251M€** de fonds de concours correspondant à la participation de la Région Centre a été versé à l'Etat par l'Etablissement, soit **69%** du montant conventionné avec l'Etat.

Compte tenu des informations fournies par les services de l'Etat, au 31/12/2011, le montant de réalisation de cette programmation s'élève à **2,483M€** (contre 1,552M€ fin 2010), soit un taux de mandatement de l'Etat de **47%** (contre 28% fin 2010).

Sur les 9 opérations de cette programmation, **5 sont achevées physiquement à ce jour**. Il s'agit de 2 opérations dans le Loiret (LEV 45-23 et LEV 45-2), de 2 opérations en Indre-et-Loire (LEV 37-13 et LIT 37-2) et d'une opération dans le Cher (LEV 18-5).

A l'inverse, **3 opérations sont peu avancées** compte tenu de leur date de programmation. Il s'agit des opérations LEV 37-2, LIT 37-1 et LEV 45-8 à 14 (les deux dernières étant des opérations d'études) dont les taux de mandatement s'échelonnent de 0 à 20%.

Le tableau détaillé de suivi des opérations programmées en 2009 est présenté en annexe 2 de ce rapport.

### **II.3 Programmation 2010 :**

Cette troisième programmation comprend **12 opérations** programmées en 2010 (9 en juin et 3 en octobre) pour un **montant total de 6,918M€** et une **participation de la Région Centre de 2,395M€** :

- 8 opérations concernent des travaux et études sur les levées pour un montant de 4,118M€, dont une étude (LEV 18-7) sous maîtrise d'ouvrage de l'EP Loire qui est également financée par le FEDER (plan de financement : 40% FEDER, 30% Etat, 15% Région Centre et 15% Département du Cher),
- 4 opérations concernent des travaux sur le lit pour un montant de 2,8M€.

Suite à l'augmentation du coût de l'opération LEV 45-3 annoncée par les services de l'Etat en 2011, le montant total de cette programmation **a été porté à 7,168M€** au lieu de 6,918M€ **et la participation de la Région Centre à 2,478M€**. On notera que le Département du Loiret n'a pas souhaité prendre en charge l'augmentation du coût de cette opération.

De 2010 à 2011, un montant de **0,607M€** de fonds de concours correspondant à la participation de la Région Centre a été versé à l'Etat par l'Etablissement, soit **24%** du montant conventionné avec l'Etat.

Compte tenu des informations fournies par les services de l'Etat, au 31/12/2011, le montant de réalisation de cette programmation s'élève à **1,987M€** (contre 0,058M€ fin 2010), soit un taux de mandatement de l'Etat de **28%** (contre 1% fin 2010).

Sur les 12 opérations de cette programmation, **2 sont achevées physiquement à ce jour**. Il s'agit de 2 opérations en Indre-et-Loire (LEV 37-13 et LIT 37-2). Elles feront l'objet d'un solde anticipé par avenant en 2012.

Concernant l'opération LEV 18-7 d'un montant de 0,533M€ (étude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre) portée par l'EP Loire à la demande de l'Etat, la Région Centre a versé entre 2010 et 2011 une subvention de 48000€ à l'EP Loire, soit 60% de sa participation. Il est prévu d'achever cette opération fin 2012 et de la solder début 2013.

Le tableau détaillé de suivi des opérations programmées en 2010 est présenté en annexe 3 de ce rapport.

#### **II.4 Programmation 2011 :**

Cette quatrième programmation comprend **9 opérations** programmées en juin 2011 pour un **montant total de 3,735M€** et une participation correspondante de la Région Centre de **1,265M€** :

- 8 opérations concernent des travaux et études sur les levées pour un montant de 3,435M€,
- 1 opération concerne des travaux de restauration du lit (en Indre-et-Loire) pour un montant de 0,3M€.

Le montant de cette programmation a été revu à la baisse en juin 2012 pour tenir compte de l'ajustement du montant de l'opération LEV 45-26, ce qui porte la programmation à **3,545M€ et la participation correspondante de la Région Centre à 1,108M€**. Compte tenu des dernières informations transmises par les services de l'Etat, le montant de l'opération LEV 45-26 devrait encore être revu à la baisse en octobre 2012.

En 2011, un montant de **0,126M€** de fonds de concours correspondant à la participation de la Région Centre a été versé à l'Etat par l'Etablissement, soit **11%** du montant conventionné avec l'Etat.

Compte tenu des informations fournies par les services de l'Etat, au 31/12/2011, le montant de réalisation de cette programmation s'élève à 0,037M€, soit un taux de mandatement de l'Etat de 1%.

Le tableau détaillé de suivi des opérations programmées en 2011 est présenté en annexe 4 de ce rapport.

### **III Nouvelle programmation et prévisions**

#### **III.1 Programmation 2012 :**

L'EP Loire a sollicité la DREAL Centre au mois de novembre 2011 en vue de faire un premier point avec les services de l'Etat sur ses prévisions de programmation en 2012. Au cours de la réunion EP Loire – DREAL qui s'est tenue mi décembre, les services de la DREAL ont indiqué qu'il existait encore de nombreuses incertitudes sur la programmation 2012. A ce stade, une dizaine d'opérations était envisagée pour un montant global de l'ordre de 6M€ (cf. réunion du 13 décembre 2011). Suite à cette réunion, les services de l'EP Loire ont transmis un courrier à la DREAL pour demander notamment que soit effectivement exploitée la possibilité de mobilisation du FPRNM au titre du Plan de submersions rapides (PSR). Le plan de financement retenu pour les opérations du plan Loire labellisées est le suivant : 40% FPRNM, 20% Etat, 20% Région Centre et 20% Département.

L'Etat a ensuite proposé de programmer une première opération (LEV 37-1) dès le comité de gestion de février 2012 (soit avant les réunions de mise au point avec les cofinanceurs) afin de

lancer rapidement la procédure de labellisation de 2 opérations « test » au titre du PSR (LEV 45-26 programmée en 2011 et LEV 37-1).

Une programmation 2012 plus consolidée a ensuite été proposée progressivement par les services de l'Etat au cours des réunions avec les cofinanceurs entre mars et mai 2012. A ce jour, 10 opérations ont été retenues (cf. annexe 5) :

- 1 opération (LEV 37-1) programmée au comité de gestion de février au titre du PSR (dont le montant a du être réajusté à la baisse au comité de juin suivant,
- 5 opérations proposées au comité de gestion de juin, dont une (LIT 45-5) a été ajournée, et devrait pouvoir être programmée en octobre 2012,
- 4 opérations de renforcement de levées qu'il est prévu de proposer à la programmation en octobre 2012, dont 3 dans le Loiret, le Département ayant finalement décidé de reprendre le financement des opérations le concernant.

Les montants prévisionnels de certaines opérations de cette programmation fournis par les services de l'Etat ont évolué au cours des derniers mois. Selon les dernières informations (fin août), le montant de cette cinquième programmation serait de **7,760M€** pour une participation correspondante de la Région Centre de **1,779M€** :

- 7 opérations concernent des travaux sur les levées pour un montant de 7,060M€,
- 3 opérations concernent des travaux de restauration du lit pour un montant de 0,7M€.

Il est à noter que pour les opérations de cette programmation, les échéanciers de paiement de fonds de concours ont été étalés sur 4 ans (généralement 10%, 30%, 30%, 30%) au lieu des 5 ans prévus dans l'échéancier type retenu jusqu'à présent (10%, 25%, 25%, 25%, 15%) afin d'éviter un étalement du versement des contributions de la Région Centre au-delà de 2016.

Le tableau détaillé des opérations proposées en 2012 est présenté en annexe 5 de ce rapport.

### **III.2 Programmation 2013 :**

L'année 2013 est a priori la dernière année de programmation des opérations de renforcement des levées et de restauration du lit en région Centre dans le cadre du plan Loire 2007-2013.

A ce stade, cette dernière programmation est encore incertaine. Selon les informations fournies par les services de l'Etat :

- 2 à 3 opérations pourraient être programmées dans le Cher pour un montant de 0,950 à 1,450M€ (LEV 18-6, LIT 18-2 et éventuellement LEV 18-8) en fonction notamment de la possibilité de mobilisation du FPRNM qui paraît difficile compte tenu de la situation particulière de la maîtrise d'ouvrage de l'Etat dans ce département (assurée par la DDT de la Nièvre) ;
- A ce stade, le Département d'Indre-et-Loire a pratiquement atteint le montant de son engagement global pour le programme 2007-2013. Aussi, de nouvelles opérations pourraient être proposées par l'Etat si des opérations déjà programmées (LEV 37-2, LEV 37-3) pouvaient être labellisées au titre du PSR, ce qui réduirait la part du Département sur ces opérations ;
- 1 opération (LEV 41-5) pourrait être proposée dans le Loir-et-Cher pour un montant de 0,4M€. La diminution significative du montant prévisionnel de l'opération LEV 41-3 prévue à la programmation d'octobre 2012 (2,2M€ voir moins, au lieu de 3,1M€) permettrait de dégager des disponibilités financières pour financer d'autres opérations ;
- 1 à 2 opérations pourraient être proposées dans le Loiret pour un montant prévisionnel de 0,6M€ à 1,7M€ (Saint-Benoît-sur-Loire, Mareau-aux-Prés) en fonction des résultats des appels d'offres des opérations de la programmation 2012 et des disponibilités financières du Département.



Soit un montant prévisionnel global potentiel compris entre 1,5 et 6M€ pour cette programmation.

Un point plus précis sera fait avec les services de l'Etat fin 2012. A cette occasion, sera évoqué la capacité de réalisation effective de ces opérations supplémentaires.

## IV Synthèse et conclusions

Entre 2007 et 2011, **46 opérations** ont été programmées pour un montant total de **23,828M€** soit **75%** de la maquette initiale du plan Loire 2007-2013 d'un montant de 31,72M€. La participation actualisée correspondante de la Région Centre pour ces 46 opérations est de **8,098M€** sur une enveloppe de 11M€. Ce montant tient compte de la possibilité d'une mobilisation du FPRNM (fonds Barnier) qui à ce jour n'est pas complètement acquise.

L'intégration de la programmation des 10 opérations programmées ou à programmer au titre de la programmation 2012 pourra porter le montant total des **56 opérations** programmées à **31,588M€** (proche de la maquette initiale) correspondant à une participation de la Région Centre de **9,877M€**. La programmation de 2013 pourrait permettre de dépasser la maquette initiale compte tenu du financement du FPRNM de certaines opérations.

A une année de la fin de la programmation, ce taux de programmation peut être considéré comme correct bien que subsistent encore de nombreux ajustements dans la réalisation des opérations qui concernent non plus uniquement le montant ou le délai de réalisation mais, fait nouveau, l'objet et la nature des opérations proposés pour modification (élargissement d'opération d'études à des travaux de restauration du lit notamment).

Dans ce contexte, l'EP Loire a souligné la nécessité de pouvoir disposer de toutes les informations utiles (nature exacte des opérations, descriptif des travaux, intérêt des opérations, lieu des travaux, avant-projet...) pour apprécier le contenu et le montant de ces opérations ainsi que leur niveau de préparation, émettre un avis éclairé sur les propositions de l'Etat aux collectivités et assurer le suivi des évolutions éventuelles proposées. D'autant que lors des réunions techniques avec les départements, les services de l'Etat ont proposé de diminuer les montants de certaines opérations pour permettre à un co-financier de rester dans l'enveloppe financière contractualisée, ce qui pousse à s'interroger sur les modalités d'estimation du montant des opérations pour la programmation.

Comme cela a pu être constaté depuis 2009, les ajustements réalisés ont eu notamment pour conséquence, comme l'illustre le tableau ci-après, le report des opérations au-delà de l'année 2011, avec un montant prévisionnel à programmer de 7,760M€ en 2012 et de l'ordre de 3,6M€ sur 2013 (données fournies par les services de l'Etat au mois d'août 2012 sujettes à évolution).

**Evolution du montant global des programmations annuelles**

<b>Programmations</b>	<b>Programme initial 2007</b>	<b>Situation avril 2009</b>	<b>Situation janvier 2010</b>	<b>Situation juillet 2011</b>	<b>Situation juillet 2012</b>
<b>2007-2008</b>	<i>14,735 M€</i>	8,135 M€	8,135 M€	7,615 M€	7,615 M€
<b>2009</b>	<i>7,475 M€</i>	<i>9,710 M€</i>	5,800 M€	5,500 M€	5,500 M€
<b>2010</b>	<i>8,110 M€</i>	<i>11,310 M€</i>	<i>4,940 M€</i>	6,918 M€	7,168 M€
<b>2011</b>	<i>1,400 M€</i>	<i>2,600 M€</i>	<i>12,525 M€</i>	3,835 M€	3,545 M€
<b>2012</b>	-	<i>0,300 M€</i>		8 M€	7,760 M€
<b>2013</b>	-	-	-	-	3,600 M€
<b>Total programme</b>	<b>31,720 M€</b>	<b>32,055 M€</b>	<b>31,400 M€</b>	<b>31,870 M€</b>	<b>35,188 M€</b>

N.B. : les montants annuels des programmations affichés en italique correspondent à des valeurs prévisionnelles.

Le tableau de l'annexe 6 présente les échéanciers réalisés et prévisionnels de versement des subventions de la Région Centre à l'EP Loire, ainsi que des fonds de concours de L'EP Loire à l'Etat.


L'analyse des opérations des programmations en cours montre un avancement globalement correct de chaque programmation. On observe cependant à l'intérieur de ces programmations des disparités importantes dans la réalisation des opérations, certaines étant achevées relativement rapidement, d'autres rencontrant des difficultés ou ayant à peine démarré (études de restauration du lit notamment).

On constate également en cours de réalisation des ajustements parfois nécessaires dans les montants, voire dans le contenu de certaines opérations programmées. Par ailleurs des opérations ont été reportées parfois à plusieurs reprises et de nouvelles opérations non prévues initialement ont été proposées en remplacement. A noter en particulier le report à un plan Loire suivant des quatre études de vals prévues à la programmation en début de l'actuel plan Loire et non encore engagées (LEV 37-10 et 11, LEV 37-12, LEV 41-1 et LEV 45-19).

On peut également noter des disparités dans la programmation et la réalisation des opérations d'un département à l'autre, comme le montre le graphique ci-après.

Ainsi, le taux de programmation par rapport au montant des opérations prévues dans la convention d'application du CPIER est seulement de 32% dans le Loir-et-Cher et 56% dans le Cher, contre 86% en Indre-et-Loire et 94% dans le Loiret.

Au 31/12/2011, le taux de réalisation des opérations par rapport aux montants programmés est de 39% dans le Loir-et-Cher, 39% en Indre-et-Loire, 43% dans le Loiret et 54% dans le Cher.

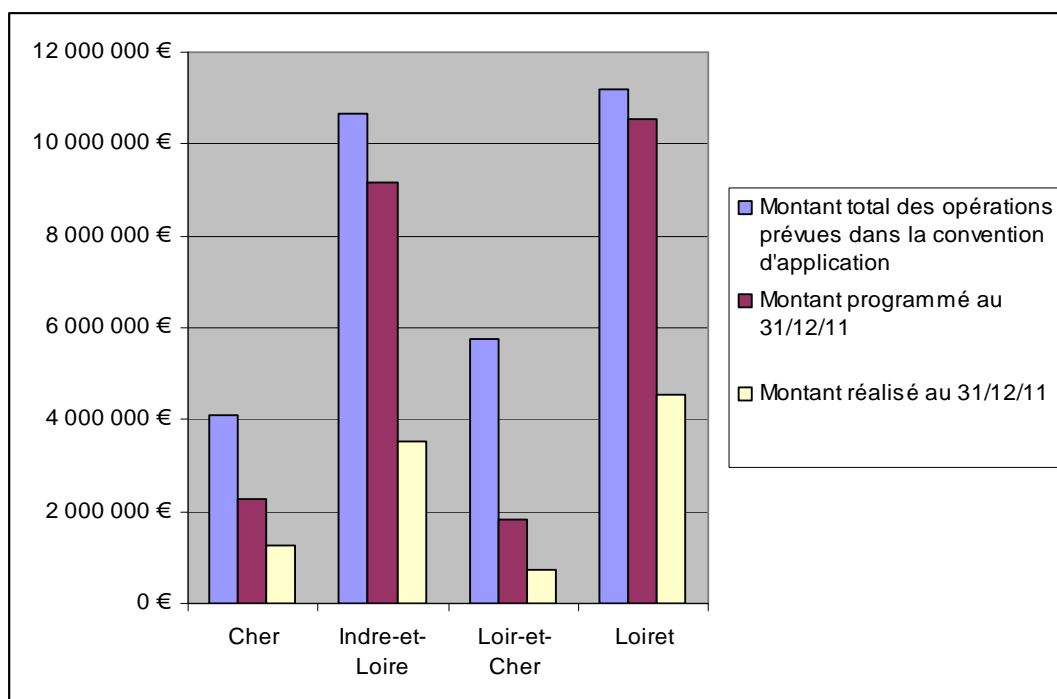

Ces disparités s'expliquent en partie par les moyens mobilisés dans les services départementaux de l'Etat en charge des opérations. De manière générale ces moyens paraissent relativement limités. Cependant, compte tenu de la clôture en 2010 des opérations du plan Loire 2000-2006, les équipes devaient être totalement mobilisées sur la mise en œuvre des opérations du plan Loire 3 à partir de 2011.

Dans le département du Cher, la sous-programmation peut également s'expliquer par l'ajustement à la baisse de l'opération de restauration sur le lit à La Charité-sur-Loire passant de 1M€ à 0,200M€. Les services de l'Etat indiquent également que ces opérations sont lourdes à mettre en place rapidement et que le coût des opérations avait été largement surestimé.

Dans le département du Loir-et-Cher, le fort retard de la programmation est également dû à la surestimation en début de programme du montant d'opérations.

L'ensemble des éléments qui précèdent pourraient plaider en faveur de la réalisation d'une analyse ou d'une évaluation beaucoup plus qualitative de l'évolution de la programmation des opérations de restauration du lit et de renforcement des levées, telle que constatée à ce jour.

## **V Annexes**

**Annexe 1 : Tableau de suivi programmations 2007-2008**

**Annexe 2 : Tableau de suivi programmation 2009**

**Annexe 3 : Tableau de suivi programmation 2010**

**Annexe 4 : Tableau de suivi programmation 2011**

**Annexe 5 : Tableau programmation 2012**

**Annexe 6 : Echancier de versement des fonds de concours et subventions**



**PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE 2007-2013**  
**Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre**

**PROGRAMMATION 2009**

N° opération	Libellé opération	Date comité de gestion	Montant de l'opération	Participation Région Centre	Réalisation 2009				Réalisation 2010				Réalisation 2011				Bilan fin 2011				Observations	N° Présage	Date avenant			
					Subvention Région à l'EP Loire	FDC versé à l'Etat	N° mandat	Engagement Etat	Mandat Etat	Subvention Région à l'EP Loire	FDC versé à l'Etat	N° mandat	Engagement Etat	Mandat Etat	Subvention Région à l'EP Loire	FDC versé à l'Etat	N° mandat	Mandat Etat	Cumul FDC versé à l'Etat	Taux versement FDC				Cumul mandatement Etat	Taux mandatement Etat	
LEV 18-5	Renforcement levées Espagne	29/01/09	499 732 €	166 561 €	27 331 €	27 331 €	M994	0 €	0 €	68 327 €	68 327 €	M579	0 €	417 397 €	68 327 €	68 327 €	M1220	82 334,67 €	163 985 €	98%	499 732 €	100%	diminution du montant de l'opération de 800K€ à 520K€ solde fin 2011	32057	19/08/2011	
<b>Total Levées 18</b>			<b>499 732 €</b>	<b>166 561 €</b>	<b>27 331 €</b>	<b>27 331 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>68 327 €</b>	<b>68 327 €</b>		<b>0 €</b>	<b>417 397 €</b>	<b>68 327 €</b>	<b>68 327 €</b>		<b>82 334,67 €</b>	<b>163 985 €</b>	<b>98%</b>	<b>499 732 €</b>	<b>100%</b>				
<b>Total Lit et Levées 18</b>			<b>499 732 €</b>	<b>166 561 €</b>	<b>27 331 €</b>	<b>27 331 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>68 327 €</b>	<b>68 327 €</b>		<b>0 €</b>	<b>417 397 €</b>	<b>68 327 €</b>	<b>68 327 €</b>		<b>82 334,67 €</b>	<b>163 985 €</b>	<b>98%</b>	<b>499 732 €</b>	<b>100%</b>				
LEV 37-2	Renforcement levées à Montlouis	29/01/09	2 700 000 €	899 910 €	89 991 €	89 991 €	M995	10 000 €	0 €	224 978 €	224 978 €	M581	2 690 000 €	380 433 €	224 978 €	224 978 €	M1119	170 670,73 €	539 947 €	60%	551 104 €	20%	Réduction montant 3M€ à 2,7M€	32058		
LEV 37-13	Aménagement de bouchure, vannes et clapets	28/05/09	200 000 €	66 660 €	6 666 €	6 666 €	M997	200 000 €	0 €	16 665 €	16 665 €	M582	0 €	200 000 €	43 329 €	43 329 €	M1223	-	66 660 €	100%	200 000 €	100%	solde anticipé en 2011	32552	05/08/2010	
<b>Total Levées 37</b>			<b>2 900 000 €</b>	<b>966 570 €</b>	<b>96 657 €</b>	<b>96 657 €</b>		<b>210 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>241 643 €</b>	<b>241 643 €</b>		<b>2 690 000 €</b>	<b>580 433 €</b>	<b>268 307 €</b>	<b>268 307 €</b>		<b>170 670,73 €</b>	<b>606 607 €</b>	<b>63%</b>	<b>751 104 €</b>	<b>26%</b>				
LIT 37-1	Etude restauration lit	29/01/09	300 000 €	120 000 €	12 000 €	12 000 €	M996	300 000 €	0 €	30 000 €	30 000 €	M580	0 €	0 €	30 000 €	30 000 €	M1120	0 €	72 000 €	60%	0 €	0%		32060		
LIT 37-2	Restauration du lit	28/05/09	292 810 €	117 124 €	12 000 €	12 000 €	M998	300 000 €	0 €	30 000 €	30 000 €	M583	0 €	272 743 €	75 124,09 €	75 124 €	M1225	20 067,35 €	117 124 €	100%	292 810 €	100%	solde anticipé en 2011	32551	05/08/2010	
<b>Total Lit 37</b>			<b>592 810 €</b>	<b>237 124 €</b>	<b>24 000 €</b>	<b>24 000 €</b>		<b>600 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>60 000 €</b>	<b>60 000 €</b>		<b>0 €</b>	<b>272 743 €</b>	<b>105 124 €</b>	<b>105 124 €</b>		<b>20 067 €</b>	<b>189 124 €</b>	<b>80%</b>	<b>292 810 €</b>	<b>49%</b>				
<b>Total Lit et levées 37</b>			<b>3 492 810 €</b>	<b>1 203 694 €</b>	<b>120 657 €</b>	<b>120 657 €</b>		<b>810 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>301 643 €</b>	<b>301 643 €</b>		<b>2 690 000 €</b>	<b>853 176 €</b>	<b>373 431 €</b>	<b>373 431 €</b>		<b>190 738 €</b>	<b>795 731 €</b>	<b>66%</b>	<b>1 043 914 €</b>	<b>30%</b>				
LEV 45-8 à 14	Etude de maturation II	29/01/09	330 000 €	109 989 €	10 999 €	10 999 €	M1000	330 000 €	16 334 €	27 497 €	27 497 €	M584	0 €	28 883 €	27 497 €	27 497 €	M1121	8 756,79 €	65 993 €	60%	53 974 €	16%		32061		
LEV 45-2	Renforcement pied de levée Rio (1ere phase)	29/10/09	90 243 €	30 078 €	33 330 €	0 €		5 000 €	0 €	-15 832 €	17 498 €	M585	0 €	90 243 €	12 499 €	12 499 €	M1228	-	29 997 €	100%	90 243 €	100%	Réduction montant 1M€ à 0,15M€.	32557	19/08/2011	
LEV 45-5	Renforcement voile étanche Saint-Père-sur-Loire	29/10/09	850 000 €	283 305 €	26 664 €	0 €		5 000 €	0 €	72 493 €	99 157 €	M586	0 €	36 615 €	70 826 €	70 826 €	M1122	705 347,96 €	169 983 €	60%	741 963 €	87%	Augmentation montant 0,8M€ (prévu initialement) à 0,85M€.	32558		
LEV 45-23	Renforcement pied de levées à Gernigny	28/05/09	53 623 €	17 873 €	4 999 €	25 000 €	M999	55 000 €	53 623 €	12 665,90 €	0 €		0 €	0 €	208,00 €	-		-	25 000 €	140%	53 623 €	100%	opération soldée à 53 622,96 Attente remboursement Etat de 7 127,47	32561		
<b>Total Levées 45</b>			<b>1 323 866 €</b>	<b>441 245 €</b>	<b>75 992 €</b>	<b>35 999 €</b>		<b>395 000 €</b>	<b>69 957 €</b>	<b>96 824 €</b>	<b>144 152 €</b>		<b>0 €</b>	<b>155 741 €</b>	<b>111 030 €</b>	<b>110 822 €</b>		<b>714 105 €</b>	<b>290 973 €</b>	<b>66%</b>	<b>939 803 €</b>	<b>71%</b>				
<b>Total lit et Levées 45</b>			<b>1 323 866 €</b>	<b>441 245 €</b>	<b>75 992 €</b>	<b>35 999 €</b>		<b>395 000 €</b>	<b>69 957 €</b>	<b>96 824 €</b>	<b>144 152 €</b>		<b>0 €</b>	<b>155 741 €</b>	<b>111 030 €</b>	<b>110 822 €</b>		<b>714 105 €</b>	<b>290 973 €</b>	<b>66%</b>	<b>939 803 €</b>	<b>71%</b>				
<b>Total Levées région Centre</b>			<b>4 723 598 €</b>	<b>1 574 376 €</b>	<b>199 980 €</b>	<b>159 987 €</b>		<b>605 000 €</b>	<b>69 957 €</b>	<b>406 793 €</b>	<b>454 122 €</b>		<b>2 690 000 €</b>	<b>1 153 571 €</b>	<b>447 664 €</b>	<b>447 456 €</b>		<b>967 110 €</b>	<b>1 061 565 €</b>	<b>67%</b>	<b>2 190 638 €</b>	<b>46%</b>				
<b>Total Lit région Centre</b>			<b>592 810 €</b>	<b>237 124 €</b>	<b>24 000 €</b>	<b>24 000 €</b>		<b>600 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>60 000 €</b>	<b>60 000 €</b>		<b>0 €</b>	<b>272 743 €</b>	<b>105 124 €</b>	<b>105 124 €</b>		<b>20 067 €</b>	<b>189 124 €</b>	<b>80%</b>	<b>292 810 €</b>	<b>49%</b>				
<b>Total Lit et Levées région Centre</b>			<b>5 316 408 €</b>	<b>1 811 500 €</b>	<b>223 980 €</b>	<b>183 987 €</b>		<b>1 205 000 €</b>	<b>69 957 €</b>	<b>466 793 €</b>	<b>514 122 €</b>		<b>2 690 000 €</b>	<b>1 426 314 €</b>	<b>552 788 €</b>	<b>552 580 €</b>		<b>987 178 €</b>	<b>1 250 689 €</b>	<b>69%</b>	<b>2 483 448 €</b>	<b>47%</b>				
<b>Opérations non programmées</b>																										
Montant litres																										
Titres émis																										
<b>Trop perçu annuel</b>																										

**PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE 2007-2013**  
**Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre**

**PROGRAMMATION 2010**

N° opération	Libellé opération	Date comite de gestion	Montant de l'opération	Participation Région Centre	Réalisation 2010					Réalisation 2011				Bilan fin 2011				Observations	N° Présage	Date avenant	
					Subvention Région à l'EP Loire	FDC versé à l'Etat	N° mandat	Engagement Etat	Mandatement Etat	Subvention Région à l'EP Loire	FDC versé à l'Etat	N° mandat	Mandatement Etat	Cumul FDC versé à l'Etat	Taux versement FDC	Cumul mandatement Etat	Taux mandatement Etat				
LEV 18-7	Etudes des vals du Cher (MO EPLoire)	03/06/10	533 333 €	80 000 €	8 000 €	-	-	-	-	40 000 €	-	-	-	-	-	-	-	-	Maîtrise d'ouvrage EP Loire. Le montant intègre études, AMO et renfort occasionnel de 2x 6 mois	34158	
<b>Total Levées 18</b>			<b>533 333 €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>8 000 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 000 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>Total Lit et Levées 18</b>			<b>533 333 €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>8 000 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 000 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
LEV 37-3	Renforcement de levée à Saint-Pierre-des-corps	03/06/10	1 700 000 €	566 610 €	56 661 €	56 661 €	M89	1 700 000 €	0 €	141 653 €	141 653 €	M638	597 432 €	198 314 €	35%	597 432 €	35%		34210		
LEV 37-13	Aménagement de vanne, clapets et déboisements-trx 2011	03/06/10	135 000 €	44 996 €	4 500 €	4 500 €	M90	135 000 €	0 €	11 249 €	11 249 €	M639	129 338 €	15 749 €	35%	129 338 €	96%	Proposition de solde anticipé en 2012. Avenant en cours	34213		
<b>Total Levées 37</b>			<b>1 835 000 €</b>	<b>611 606 €</b>	<b>61 161 €</b>	<b>61 161 €</b>		<b>1 835 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>152 902 €</b>	<b>152 902 €</b>		<b>726 770 €</b>	<b>214 063 €</b>	<b>35%</b>	<b>726 770 €</b>	<b>40%</b>				
Lit 37-2	Restauration du lit-trx 2011	03/06/10	300 000 €	120 000 €	12 000 €	12 000 €	M91	300 000 €	0 €	30 000 €	30 000 €	M640	296 166 €	42 000 €	35%	296 166 €	99%	Proposition de solde anticipé en 2012. Avenant en cours	34212		
<b>Total Lit 37</b>			<b>300 000 €</b>	<b>120 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>12 000 €</b>		<b>300 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>		<b>296 166 €</b>	<b>42 000 €</b>	<b>35%</b>	<b>296 166 €</b>	<b>99%</b>				
<b>Total Lit et Levées 37</b>			<b>2 135 000 €</b>	<b>731 606 €</b>	<b>73 161 €</b>	<b>73 161 €</b>		<b>2 135 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>182 902 €</b>	<b>182 902 €</b>		<b>1 022 936 €</b>	<b>256 063 €</b>	<b>35%</b>	<b>1 022 936 €</b>	<b>48%</b>				
LEV 41-3	Renforcement de pieds de levée à Veuves (île de la Chaumaine)	21/10/10	300 000 €	99 990 €	0 €	0 €		0 €	0 €	9 999 €	9 999 €	M1024	142 666 €	9 999 €	10%	142 666 €	48%		34975		
<b>Total Levées 41</b>			<b>300 000 €</b>	<b>99 990 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9 999 €</b>	<b>9 999 €</b>		<b>142 666 €</b>	<b>9 999 €</b>	<b>10%</b>	<b>142 666 €</b>	<b>48%</b>				
LIT 41-2	Restauration du lit-trx 2011-2014	03/06/10	500 000 €	200 000 €	20 000 €	20 000 €	M92	0 €	0 €	50 000 €	50 000 €	M641	95 946 €	70 000 €	35%	95 946 €	19%		34215		
<b>Total Lit 41</b>			<b>500 000 €</b>	<b>200 000 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>		<b>- 0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>		<b>95 946 €</b>	<b>70 000 €</b>	<b>35%</b>	<b>95 946 €</b>	<b>19%</b>				
<b>Total Lit et Levées 41</b>			<b>800 000 €</b>	<b>299 990 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>59 999 €</b>	<b>59 999 €</b>		<b>238 612 €</b>	<b>79 999 €</b>	<b>27%</b>	<b>238 612 €</b>	<b>30%</b>				
LEV 45-16 à 18	Etudes de maturation III	03/06/10	450 000 €	149 985 €	14 999 €	14 999 €	M93	0 €	0 €	37 496 €	37 496 €	M642	10 504 €	52 495 €	35%	10 504 €	2%		34219		
LEV 45-3	Renforcement pied de levée Bouteille	03/06/10	950 000 €	316 635 €	23 331 €	23 331 €	M94	0 €	0 €	58 328 €	58 328 €	M643	470 747 €	81 659 €	26%	470 747 €	50%		34214		
LEV 45-7	Chemins de service-études, acquisitions et travaux préalable	21/10/10	100 000 €	33 330 €	0 €	0 €		0 €	0 €	3 333 €	3 333 €	M1025	0 €	3 333 €	10%	0 €	0%		34974		
LEV 45-22	Restauration de vannes, clapets et bouchures	03/06/10	200 000 €	66 660 €	6 666 €	6 666 €	M95	44 000 €	44 108 €	16 665 €	16 665 €	M644	0 €	23 331 €	35%	44 108 €	22%		34217		
<b>Total Levées 45</b>			<b>1 700 000 €</b>	<b>566 610 €</b>	<b>44 996 €</b>	<b>44 996 €</b>		<b>44 000 €</b>	<b>44 108 €</b>	<b>115 822 €</b>	<b>115 822 €</b>		<b>481 251 €</b>	<b>160 818 €</b>	<b>28%</b>	<b>525 358 €</b>	<b>31%</b>				
LIT 45-3	Traverse d'Orléans : Duit Saint Charles	21/10/10	1 700 000 €	680 000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	68 000 €	68 000 €	M1026	0 €	68 000 €	10%	0 €	0%		34977		
LIT 45-5	Restauration du lit dans le Loiret - trx 2011-2012-2013	03/06/10	300 000 €	120 000 €	12 000 €	12 000 €	M96	20 000 €	13 928 €	30 000 €	30 000 €	M645	186 107 €	42 000 €	35%	200 035 €	67%		34216		
<b>Total Lit 45</b>			<b>2 000 000 €</b>	<b>800 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>12 000 €</b>		<b>20 000 €</b>	<b>13 928 €</b>	<b>98 000 €</b>	<b>98 000 €</b>		<b>186 107 €</b>	<b>110 000 €</b>	<b>14%</b>	<b>200 035 €</b>	<b>10%</b>				
<b>Total Lit et Levées 45</b>			<b>3 700 000 €</b>	<b>1 366 610 €</b>	<b>56 996 €</b>	<b>56 996 €</b>		<b>64 000 €</b>	<b>58 036 €</b>	<b>213 822 €</b>	<b>213 822 €</b>		<b>667 358 €</b>	<b>270 818 €</b>	<b>20%</b>	<b>725 394 €</b>	<b>20%</b>				
<b>Total Levées région Centre</b>			<b>4 368 333 €</b>	<b>1 358 205 €</b>	<b>114 157 €</b>	<b>106 157 €</b>		<b>1 879 000 €</b>	<b>44 108 €</b>	<b>318 723 €</b>	<b>278 723 €</b>		<b>1 350 687 €</b>	<b>384 880 €</b>	<b>28%</b>	<b>1 394 794 €</b>	<b>32%</b>				
<b>Total Lit région Centre</b>			<b>2 800 000 €</b>	<b>1 120 000 €</b>	<b>44 000 €</b>	<b>44 000 €</b>		<b>320 000 €</b>	<b>13 928 €</b>	<b>178 000 €</b>	<b>178 000 €</b>		<b>578 219 €</b>	<b>222 000 €</b>	<b>20%</b>	<b>592 147 €</b>	<b>21%</b>				
<b>Total Lit et Levées région Centre</b>			<b>7 168 333 €</b>	<b>2 478 205 €</b>	<b>158 157 €</b>	<b>150 157 €</b>		<b>2 199 000 €</b>	<b>58 036 €</b>	<b>496 723 €</b>	<b>456 723 €</b>		<b>1 928 906 €</b>	<b>606 880 €</b>	<b>24%</b>	<b>1 986 942 €</b>	<b>28%</b>				
Titre émis					T214					T278 + T79											
<b>Total opérations programmation CG juin</b>			<b>5 068 333 €</b>	<b>1 664 885 €</b>	<b>158 157 €</b>	<b>150 157 €</b>				<b>415 391 €</b>	<b>375 391 €</b>		<b>1 786 240 €</b>	<b>525 548 €</b>	<b>32%</b>	<b>1 844 276 €</b>	<b>36%</b>				
<b>Total opérations programmation CG octobre</b>			<b>2 100 000 €</b>	<b>813 320 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>				<b>81 332 €</b>	<b>81 332 €</b>		<b>142 666 €</b>	<b>81 332 €</b>	<b>10%</b>	<b>142 666 €</b>	<b>7%</b>				
<b>Total programmation 2010</b>			<b>7 168 333 €</b>	<b>2 478 205 €</b>	<b>158 157 €</b>	<b>150 157 €</b>				<b>496 723 €</b>	<b>456 723 €</b>		<b>1 928 906 €</b>	<b>606 880 €</b>	<b>24%</b>	<b>1 986 942 €</b>	<b>28%</b>				

**PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE 2007-2013**  
**Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre**

**PROGRAMMATION 2011**

N° opération	Libellé opération	Date comité de gestion	Montant de l'opération	Participation Région Centre	Réalisation 2011				Bilan fin 2011				Observations	N° Présage
					Subvention Région à l'EP Loire	FDC versé à l'Etat	N° mandat	Mandatement Etat	Cumul FDC versé à l'Etat	Taux versement FDC	Cumul mandatement Etat	Taux mandatement Etat		
LEV18-2 et 3	Lutte contre animaux fouisseurs et création des chemins de service	09/06/11	150 000 €	49 995 €	5 000 €	5 000 €	M1035	0 €	5 000 €	10%	0 €	0%		35701
<b>Total Levées 18</b>			<b>150 000 €</b>	<b>49 995 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>		<b>0 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>10%</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>		
<b>Total Lit et Levées 18</b>			<b>150 000 €</b>	<b>49 995 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>		<b>0 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>10%</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>		
LEV 37-8	Chemin de services	09/06/11	250 000 €	83 325 €	8 333 €	8 333 €	M1033	2 222 €	8 333 €	10%	2 222 €	1%		35708
LEV 37-13	Aménagement de vannes et clapets et déboisements (trx2012)	09/06/11	125 000 €	41 662,50 €	4 166 €	4 166 €	M1032	25 393 €	4 166 €	10%	25 393 €	20%		35710
LEV 37-14	Renforcement de levées à Langeais	09/06/11	970 000 €	323 301 €	32 330 €	32 330 €	M1031	0	32 330 €	10%	0 €	0%		35707
<b>Total Levées 37</b>			<b>1 345 000 €</b>	<b>448 289 €</b>	<b>44 829 €</b>	<b>44 829 €</b>		<b>27 615 €</b>	<b>44 829 €</b>	<b>10%</b>	<b>27 615 €</b>	<b>2%</b>		
LIT 37-2	Restauration du lit-trx 2012	09/06/11	300 000 €	120 000 €	12 000 €	12 000 €	M1030	9 769 €	12 000 €	10%	9 769 €	3%		35711
<b>Total Lit 37</b>			<b>300 000 €</b>	<b>120 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>12 000 €</b>		<b>9 769 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>10%</b>	<b>9 769 €</b>	<b>3%</b>		
<b>Total Lit et Levées 37</b>			<b>1 645 000 €</b>	<b>568 289 €</b>	<b>56 829 €</b>	<b>56 829 €</b>		<b>37 384 €</b>	<b>56 829 €</b>	<b>10%</b>	<b>37 384 €</b>	<b>2%</b>		
LEV 41-5	Création de chemins de service associés à la protection de pied de levée côté Loire	09/06/11	250 000 €	83 325 €	8 333 €	8 333 €	M1034	0 €	8 333 €	10%	0 €	0%		35712
<b>Total Levées 41</b>			<b>250 000 €</b>	<b>83 325 €</b>	<b>8 333 €</b>	<b>8 333 €</b>		<b>0 €</b>	<b>8 333 €</b>	<b>10%</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>		
<b>Total Lit et Levées 41</b>			<b>250 000 €</b>	<b>83 325 €</b>	<b>8 333 €</b>	<b>8 333 €</b>		<b>0 €</b>	<b>8 333 €</b>	<b>10%</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>		
LEV 45-6	Acquisition de la binette à Bou	09/06/11	300 000 €	99 990 €	9 999 €	9 999 €	M1029	0 €	9 999 €	10%	0 €	0%		35703
LEV 45-25	Renforcement expérimental de levée par recouvrement sur plusieurs zones du val d'Orléans	09/06/11	500 000 €	166 650 €	16 665 €	16 665 €	M1028	0 €	16 665 €	10%	0 €	0%		35705
LEV 45-26	Renforcement de pied de levée sur le site de Melleray (château de l'Isle)	09/06/11	700 000 €	140 000 €	29 664 €	29 664 €	M1027	0 €	29 664 €	21%	0 €	0%	Montant diminué suite résultat appel d'offre (700K€ au lieu de 890K€) et intégration du FPRN	35706
<b>Total Levées 45</b>			<b>1 500 000 €</b>	<b>406 640 €</b>	<b>56 328 €</b>	<b>56 328 €</b>		<b>0 €</b>	<b>56 328 €</b>	<b>14%</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>		
<b>Total Lit et Levées 45</b>			<b>1 500 000 €</b>	<b>406 640 €</b>	<b>56 328 €</b>	<b>56 328 €</b>		<b>0 €</b>	<b>56 328 €</b>	<b>14%</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>		
<b>Total Levées région Centre</b>			<b>3 245 000 €</b>	<b>988 249 €</b>	<b>114 490 €</b>	<b>114 490 €</b>		<b>27 615 €</b>	<b>114 490 €</b>	<b>12%</b>	<b>27 615 €</b>	<b>1%</b>		
<b>Total Lit région Centre</b>			<b>300 000 €</b>	<b>120 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>12 000 €</b>		<b>9 769 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>10%</b>	<b>9 769 €</b>	<b>3%</b>		
<b>Total Lit et Levées région Centre</b>			<b>3 545 000 €</b>	<b>1 108 249 €</b>	<b>126 490 €</b>	<b>126 490 €</b>		<b>37 384 €</b>	<b>126 490 €</b>	<b>11%</b>	<b>37 384 €</b>	<b>1%</b>		
Titres émis					T280									



**PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE 2007-2013**  
*Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre*

**PROGRAMMATION 2012**

N° opération	Libellé opération	Date comité de gestion	Montant de l'opération	Participation Région Centre	Prévision de réalisation 2012		N° Présage
					Subvention Région à l'EP Loire	FDC à verser à l'Etat	
LIT 18-4	Restauration du lit suite étude de définition	07/06/2012	100 000 €	40 000 €	4 000 €	4 000 €	32555
<b>Total Lit 18</b>			<b>100 000 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>4 000 €</b>	<b>4 000 €</b>	
<b>Total Levées et Lit 18</b>			<b>100 000 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>4 000 €</b>	<b>4 000 €</b>	
LEV 37-1	Renforcement de levée à Amboise- 1ère phase	09/02/2012	1 300 000 €	260 000 €	26 000 €	30 000 €	37204
LEV 37-13	Amenagement de vannes et clapets et déboisement et lutte contre les animaux fouisseurs (trx2013)	07/06/2012	250 000 €	83 325 €	8 333 €	8 333 €	37789
<b>Total Levées 37</b>			<b>1 550 000 €</b>	<b>343 325 €</b>	<b>34 333 €</b>	<b>38 333 €</b>	
LIT 37-2	Restauration du lit-trx 2013	07/06/2012	300 000 €	120 000 €	12 000 €	12 000 €	37788
<b>Total Lit 37</b>			<b>300 000 €</b>	<b>120 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	
<b>Total Levées et Lit 37</b>			<b>1 850 000 €</b>	<b>463 325 €</b>	<b>46 333 €</b>	<b>50 333 €</b>	
LEV41-5	Création de chemins de services- 3ème phase (La Saulas)	07/06/2012	400 000 €	133 320 €	13 332 €	13 332 €	37787
LEV 41-3	Restauration du corps de digues à Veuves	oct.-12	2 200 000 €	440 000 €	0 €	0 €	
<b>Total Levées 41</b>			<b>2 600 000 €</b>	<b>573 320 €</b>	<b>13 332 €</b>	<b>13 332 €</b>	
<b>Total Lit et Levées 41</b>			<b>2 600 000 €</b>	<b>573 320 €</b>	<b>13 332 €</b>	<b>13 332 €</b>	
LEV 45-27	Renforcement des pieds de levée à Jargeau	oct.-12	410 000 €	82 000 €	0 €	0 €	
LEV 45-28	Renforcement des pieds de levée à Sully	oct.-12	1 200 000 €	240 000 €	0 €	0 €	
LEV 45-11	Renforcement des pieds de levée à Bou-Chécy	oct.-12	1 300 000 €	260 000 €	0 €	0 €	
<b>Total Levées 45</b>			<b>2 910 000 €</b>	<b>582 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
LIT 45-5	Restauration du lit dans le Loiret- trx 2013-2014	07/06/2012 (ajourné) oct-12	300 000 €	120 000 €	12 000 €	12 000 €	
<b>Total Lit 45</b>			<b>300 000 €</b>	<b>120 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	
<b>Total Lit et Levées 45</b>			<b>3 210 000 €</b>	<b>702 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	
<b>Total Levées région Centre</b>			<b>7 060 000 €</b>	<b>1 498 645 €</b>	<b>47 665 €</b>	<b>51 665 €</b>	
<b>Total Lit région Centre</b>			<b>700 000 €</b>	<b>280 000 €</b>	<b>28 000 €</b>	<b>28 000 €</b>	
<b>Total Lit et Levées région Centre</b>			<b>7 760 000 €</b>	<b>1 778 645 €</b>	<b>75 665 €</b>	<b>79 665 €</b>	
Total opérations programmation CG février et juin			2 350 000 €	636 645 €	63 665 €	67 665 €	
Total opérations programmation CG octobre (prévisionnel)			5 410 000 €	1 142 000 €	12 000 €	12 000 €	
Total opérations programmation 2012 (prévisionnel)			7 760 000 €	1 778 645 €	75 665 €	79 665 €	

**PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE 2007-2013**

Programme de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre

**Echéancier de versements subventions et fonds de concours (situation août 2012)**

**Subventions de la Région Centre à l'EP Loire**

Année de programmation	Montant progr. actualisé	Participation Région Centre	Subventions annuelles Région Centre								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>2007/2008</b>	7 500 688 €	2 599 732 €	317 277 €	743 191 €	686 550 €	520 798 €	44 610 €	94 488 €	105 990 €	86 829 €	
<b>2009</b>	5 216 408 €	1 778 170 €		319 388 €	371 386 €	552 788 €	298 461 €	144 151 €	57 499 €	34 499 €	
<b>2010 juin</b>	4 868 333 €	1 598 225 €			158 157 €	415 391 €	488 053 €	378 221 €	158 404 €		
<b>2010 octobre</b>	2 100 000 €	813 320 €				81 332 €	203 330 €	203 330 €	203 330 €	121 998 €	
<b>2011</b>	3 395 000 €	1 078 249 €				126 490 €	316 222 €	248 240 €	242 063 €	145 234 €	
<b>2012 fév+juin</b>	2 350 000 €	636 645 €					63 665 €	190 994 €	190 994 €	190 992 €	
<b>2012 oct.</b>	5 410 000 €	1 142 000 €					12 000 €	138 200 €	342 600 €	342 600 €	306 600 €
<b>2013</b>	à préciser	à préciser						à préciser	à préciser	à préciser	à préciser
<b>Totaux</b>	<b>30 840 429 €</b>	<b>9 646 341 €</b>	<b>317 277 €</b>	<b>1 062 579 €</b>	<b>1 216 092 €</b>	<b>1 696 798 €</b>	<b>1 426 341 €</b>	<b>1 397 624 €</b>	<b>1 300 880 €</b>	<b>922 152 €</b>	<b>306 600 €</b>

Légende :      Montant  Perçu       A percevoir       Prévisionnel

**Fonds de concours versés à l'Etat par l'EP Loire**

Année de programmation	Montant progr. actualisé	Participation Région Centre	Fonds de concours annuels								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>2007/2008</b>	7 500 688 €	2 599 732 €	317 277 €	743 191 €	686 550 €	520 798 €	44 610 €	94 488 €	105 990 €	86 829 €	
<b>2009</b>	5 216 408 €	1 778 170 €		183 987 €	514 122 €	552 580 €	298 461 €	144 151 €	57 499 €	34 499 €	
<b>2010 juin</b>	4 868 333 €	1 598 225 €			150 157 €	375 391 €	463 053 €	371 221 €	158 404 €		
<b>2010 octobre</b>	2 100 000 €	813 320 €				81 332 €	203 331 €	203 331 €	203 330 €	121 996 €	
<b>2011</b>	3 395 000 €	1 078 249 €				126 490 €	316 222 €	248 240 €	242 063 €	145 234 €	
<b>2012 fév+juin</b>	2 350 000 €	636 645 €					63 665 €	190 994 €	190 994 €	190 992 €	
<b>2012 oct.</b>	5 410 000 €	1 142 000 €					12 000 €	138 200 €	342 600 €	342 600 €	306 600 €
<b>2013</b>	à préciser	à préciser						à préciser	à préciser	à préciser	à préciser
<b>Totaux</b>	<b>30 840 429 €</b>	<b>9 646 341 €</b>	<b>317 277 €</b>	<b>927 178 €</b>	<b>1 350 828 €</b>	<b>1 656 591 €</b>	<b>1 401 342 €</b>	<b>1 390 625 €</b>	<b>1 300 880 €</b>	<b>922 150 €</b>	<b>306 600 €</b>

Légende :      Montant  Mandaté       A payer       Prévisionnel

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Ecart Subventions recues-FDC versés</b>	0 €	135 401 €	-134 736 €	40 208 €	24 999 €	6 999 €	0 €	2 €	0 €
