

Bilan des inspections 2015 des ouvrages de Naussac et de Villerest

Les visites d'inspection annuelle se sont déroulées le 15 octobre 2015 pour Naussac et le 4 novembre 2015 pour Villerest. Elles ont été réalisées par les services de contrôle respectifs des deux ouvrages (DREAL Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées pour Naussac et DREAL Auvergne Rhône-Alpes, pour Villerest), en présence des services de l'Etablissement public Loire et de son exploitant (BRL Exploitation).

Pour chaque visite, il a été procédé au bilan de l'entretien, de l'exploitation et de la surveillance à partir des documents réglementaires que doit transmettre le maître d'ouvrage (rapports d'auscultation, d'exploitation et de surveillance, de visite technique approfondie, registre de l'exploitant). Le service de contrôle a effectué ensuite un contrôle visuel des principales zones qui composent l'ouvrage et un examen des suites données à l'inspection précédente.


Les deux inspections ont débouché sur des conclusions favorables, en date de février 2016. Pour ce qui est de Villerest, il est indiqué : « L'examen des documents de suivi et la visite montrent que l'ouvrage est bien entretenu et n'ont pas mis en évidence d'écart remettant en cause la qualité du suivi et de l'entretien du barrage. ». Pour ce qui concerne Naussac, il est indiqué : « Sous réserve de la prise en compte des demandes formulées, le service de contrôle constate que l'exploitant remplit correctement sa mission de surveillance en procédant à des visites périodiques de l'ouvrage, en réalisant et en interprétant les mesures d'auscultation, en entretenant en bon état de fonctionnement les dispositifs d'auscultation ainsi que des organes de sécurité, et en procédant régulièrement à des essais de manœuvre de ces derniers. ».

Le tableau suivant présente les principales demandes, avec des échéances jusqu'à 2019.

Barrage	Objet	Echéance	Observation
Naussac	Modifications apportées à l'étude de l'onde de submersion et au rapport préalable au PPI pour répondre aux réserves et demandes du CTPBOH	Novembre 2015	Etudes transmises au service de contrôle. Etudes complémentaires prévues en 2016
	Réparation du mur de soutènement en gabions en partie aval supérieure rive gauche	Fin 2016	Travaux programmés au budget 2016
	Modernisation du contrôle-commande de supervision du barrage	Fin 2017	Marché lancé en 2015. Travaux en cours
	Curage des drains D1, D3, D5 et d2 ; du piézomètre P4 ; du drain RG de la digue du Cheylaret	Fin 2019	Travaux effectués fin 2015
Villerest	Poursuite des travaux d'entretien sur les vannes par la vanne VS0	Fin 2016	Travaux programmés au budget 2016
	Remise en peinture des éléments corrodés des brimbales en partie basse du vérin de la vanne wagon de garde du pertuis des faibles débits	Fin 2016	Travaux programmés au budget 2016

Dans cet ordre de considérations, il est à relever le récent déplacement à Naussac du Président de l'Etablissement, le 27 avril.

A cette occasion, il a pu être détaillé le fonctionnement de l'ouvrage. Dans le même temps, les visites sur site ont permis de prendre la pleine mesure des différents éléments structurants du dispositif de bassin que constitue le barrage de Naussac.

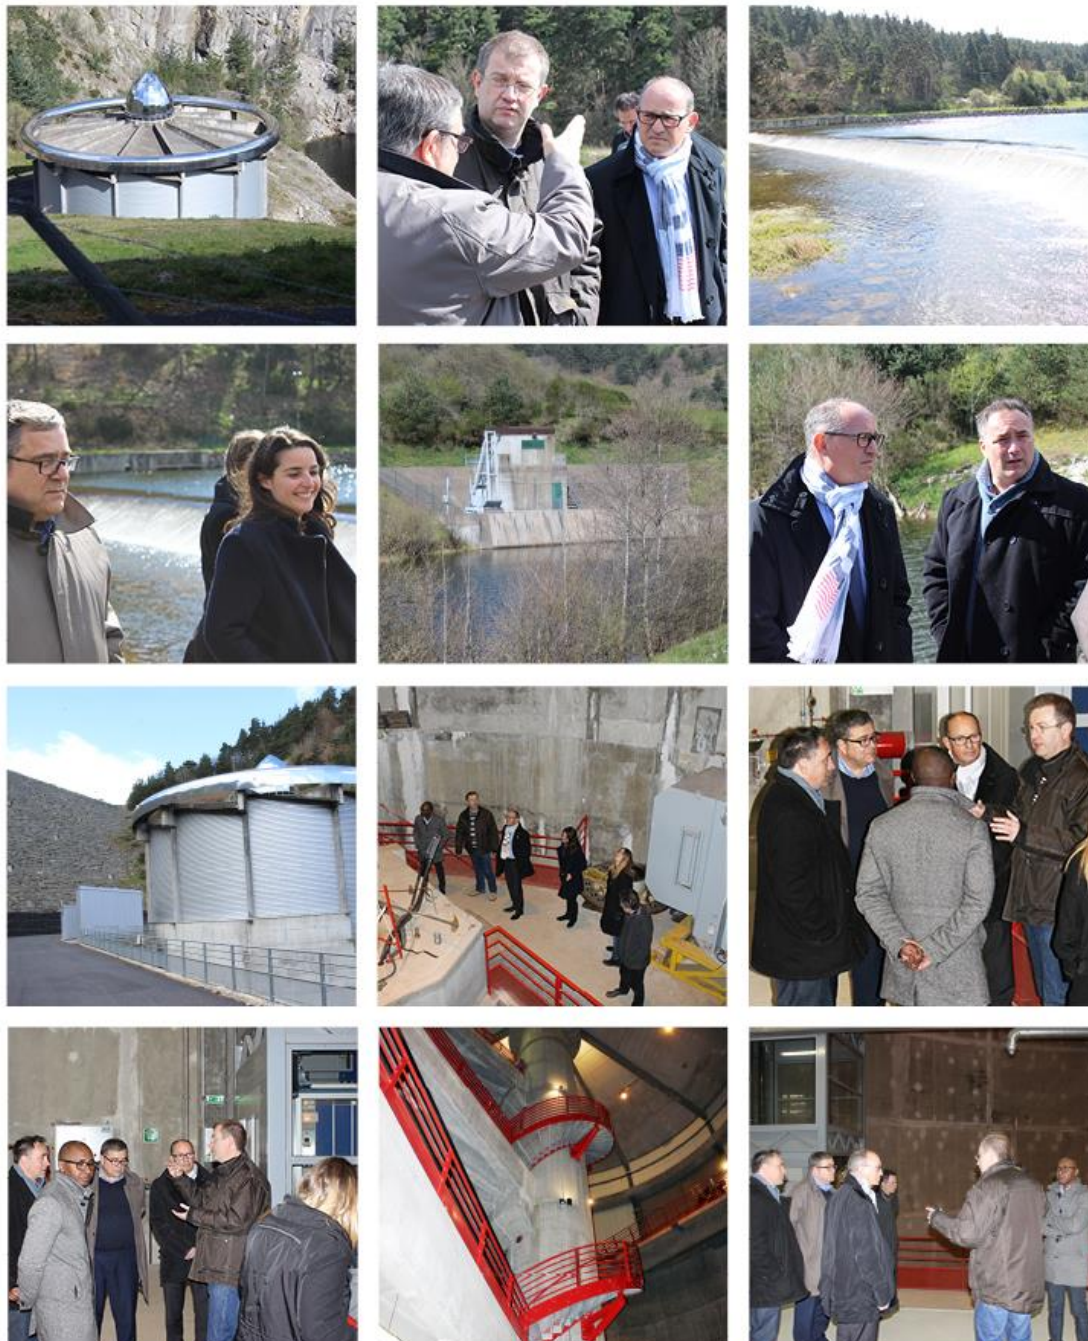

Par ailleurs, ce déplacement a permis plusieurs rencontres avec les principaux acteurs locaux, au premier rang desquels le Président et le directeur général des services de la Communauté de Communes du Haut-Allier, le Président de la CLE du Sage du Haut-Allier accompagné de l'animatrice, ainsi que la Présidente et le directeur de l'Association de préfiguration du projet de Parc Naturel Régional des Sources et Gorges du Haut-Allier.

